

Construction Projects Update

NCSD has entered the next phase of its Transition Process as our district moves from four elementary buildings to two...**CONSTRUCTION!** As we move through this stage, we will be sending out an informational document the Friday after each School Board Meeting. There is a link for you to submit questions, these will be answered in the following updates & be compiled into a Frequently Asked Questions (FAQ) Document.



Número 7: 7 de febrero de 2025

Notas generales:

Esta comunicación se envía por correo electrónico a las 9:00 a. m. del viernes después de cada reunión de la junta escolar a los miembros de nuestra junta escolar y a los maestros y personal del distrito. También enviamos esta actualización a las familias de nuestro distrito a través de Parent Square y la publicamos en las redes sociales públicas. Consulte a continuación el enlace para enviar cualquier pregunta que pueda tener sobre la Actualización del proyecto de construcción de esta semana. *Las preguntas sólo deben relacionarse con proyectos de construcción que se llevan a cabo en Aurora Heights o Thomas Jefferson.* Las actualizaciones y las preguntas frecuentes se archivan en el sitio web del distrito en los anuncios (www.newtoncsd.org).

- **¿Preguntas sobre la actualización de proyectos de construcción de esta semana?** ¡Envíalos aquí! [Enlace para enviar preguntas](#)
- La actualización del proyecto de construcción y las preguntas frecuentes (Preguntas frecuentes) se

encontrarán en nuestro [sitio web](#) en los anuncios - **¡Allí encontrará respuestas a las preguntas de la semana pasada!**

Tema	Estado	Archivos relacionados	Actualizar	Perspectiva de dos semanas
------	--------	-----------------------	------------	----------------------------

<p>Escuela Primaria Aurora Heights</p> <p>Escuela Primaria Aurora</p>	<p>In pr... ▾</p>	<p>File</p>	<p>Cronograma: Proyecto de ampliación y renovación</p> <p>El documentos de construccion para la Primaria Aurora Heights fueron presentados a la junta escolar y aprobados en la 23 de septiembre de 2024 reunión ordinaria de la junta directiva. haga clic aquí para ver el cronograma propuesto & estimación del costo del proyecto información.</p> <p>24 de octubre de 2024 - Apertura de ofertas 28 de octubre de 2024 - Audiencia pública y resoluciones 28 de octubre de 2024 - Contrato adjudicado a Graphite Construction Group (Des Moines, Iowa) por un monto total de contrato de \$12,895,000 6 de noviembre de 2024 - Reunión previa a la construcción</p> <p>Notas de la reunión de construcción más recientes: Actualizaciones de Jack Suttek, supervisor de mantenimiento <i>27 de enero - 4 de febrero de 2025</i></p> <p>EXTERIOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sin actualizaciones <p>INTERIOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demolición de las paredes de la oficina principal para la renovación de las aulas.norte (terminado) • Redireccionamiento de conductos para el sistema HVAC (ahora se están instalando algunos conductos) 	<p>Próxima reunión:</p> <p>Reunión de Avance de la Construcción: 12 de febrero de 2025</p>
---	-------------------	-------------	---	---

Tema	Estado	Archivos relacionados	Actualizar	Perspectiva de dos semanas
Heights (continuado)			<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="856 380 1461 483"> • ¡Nueva actualización! <i>27 de enero de 2025</i> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="953 453 1461 483">○ Instalación de iluminación LED. <li data-bbox="856 524 1566 980"> • ¡Nueva actualización! <i>4 de febrero de 2025</i> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="953 597 1566 662">○ Los electricistas están instalando nuevos conductos y tirando cables. <li data-bbox="953 667 1566 769">○ Los contratistas mecánicos todavía están instalando nuevas líneas de agua y ejecutando nuevos conductos. <li data-bbox="953 774 1566 873">○ La remodelación de la cocina ha comenzado con el derribo de suelos y paredes <li data-bbox="953 878 1566 980">○ El desvío de la línea de gas ha sido aprobado y los materiales están disponibles entre 2 y 3 semanas. 	

<p>Escuela Primaria Thomas Jefferson</p>	<p>In pr... ▾</p>	<p>File</p>	<p>Cronograma: Proyecto de ampliación y renovación</p> <p>El documentos de construccion para la escuela primaria Thomas Jefferson fueron presentados a la junta escolar y aprobados en la 26 de agosto de 2024 reunión ordinaria de la junta directiva. haga clic aquí para ver el cronograma propuesto y la información estimada de costos del proyecto.</p> <p>26 de septiembre, 2024 - Apertura de ofertas 30 de septiembre de 2024 - Audiencia Pública y Resoluciones 30 de septiembre de 2024 - Contrato adjudicado a Bi-State Contracting, Inc (West Burlington, Iowa) por un monto total de contrato de \$5,492,748 6 de noviembre de 2024 - Reunión previa a la construcción</p> <p>Notas de la reunión de construcción más recientes: Actualizaciones de Jack Suttek, supervisor de mantenimiento <i>27 de enero - 4 de febrero de 2025</i></p> <p>EXTERIOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se completa la colocación de las zapatas (cimientos) para permitir la construcción de las paredes exteriores de la nueva adición (Los muros este, norte y oeste están levantados) • ¡Nuevas actualizaciones! <i>Enero 27, 2025</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Se está sacando más suciedad 	<p>Próxima reunión:</p> <p>Reunión de Avance de la Construcción: 26 de febrero de 2025</p>
<p>Escuela Primaria</p>				

Tema	Estado	Archivos relacionados	Actualizar	Perspectiva de dos semanas
Thomas Jefferson (continuado)			<ul style="list-style-type: none"> ○ Los electricistas están trabajando en la instalación de electricidad empotrada. ○ Maqueta de ladrillos (para que coincida con las paredes exteriores existentes) para ser completada por arquitectos e ingenieros de FRK <p>● ¡Nuevas actualizaciones! <i>4 de febrero de 2025</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Se entregó el acero de construcción y esta semana se preparará el acero para el techo para la instalación del techo de acero. ○ Medición para ordenar ventanas ○ Preparación del interior para conductos subterráneos e instalación de hormigón. 	



Aurora Heights


1/17/2025 - 1/30/2025



Aurora Heights

1/31/25

2/06/25

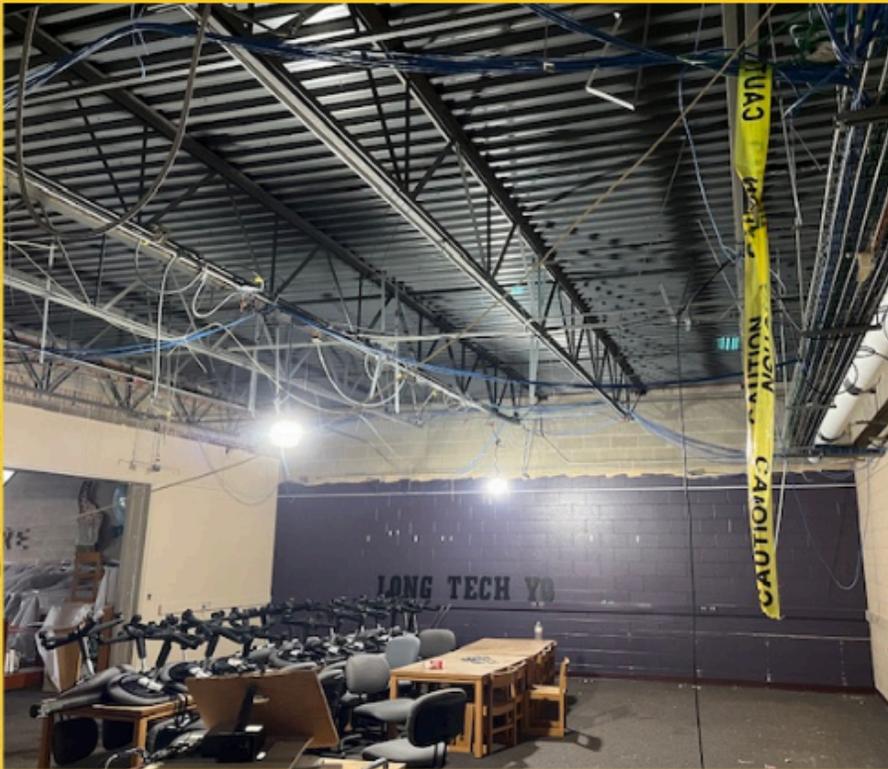



Thomas

1/17/25 - 1/29/25

Jefferson

